

Revue de projet — risques et plans d'action

Espace adhérent 2027

En cours · Santé / Médico-social

 Éclaircies — vigilance

Mise en service : 01/03/2027 (J-145)

Généré le 07/10/2026

Synthèse exécutive

Espace adhérent 2027

Météo du projet



Éclaircies — vigilance

Date de mise en service : 01/03/2027 (J-145)

Avancement des plans

0 %

0 terminé(s) sur 18

Plans en retard

0

Risques à traiter sans plan

0

Résiduels au-dessus de l'appétit

0

Points d'attention

- Plans sans porteur : 8

Principaux risques (niveau actuel)

 Fuite des données de santé des adhérents (justificatifs, actes remboursés)

Critique • 12 • Cyber

 Dérive du planning : le projet ne tient pas ses jalons

Élevé • 9 • Projet

 Compromission d'un service exposé sur Internet

Élevé • 9 • Cyber

 Analyse d'impact (AIPD) non réalisée avant la mise en service

Élevé • 9 • Métier

 Réponse erronée ou divulgation de données par l'assistant d'IA (y compris par injection d'instructions)

Élevé • 9 • Cyber

Vision du projet

Espace adhérent 2027

Périmètre

Portail web et application mobile (iOS, Android) : souscription et avenant en ligne avec signature électronique, dépôt de justificatifs avec lecture automatique, suivi des remboursements, attestation de tiers payant, messagerie sécurisée, assistant conversationnel IA ; passerelle d'API vers le système de gestion interne ; reprise des comptes existants. Hors périmètre : refonte du système de gestion des prestations, espace professionnels de santé, parcours courtiers.

Objectifs

Souscription et avenant 100 % en ligne ; dépôt de justificatifs web et mobile ; assistant IA avec passage à un conseiller ; paiement des cotisations par SEPA et carte ; -30 % d'appels « où en est mon remboursement ? » en 12 mois.

Secteur

Santé / Médico-social

Architecture



Exposition sur Internet
Zone démilitarisée (DMZ)
Applications et terminaux mobiles
Hébergement en nuage (IaaS / PaaS)
Services en ligne (SaaS)
Usage de services d'IA
API exposées à des partenaires
Interconnexion avec un tiers
SI sensible
Système d'administration
Journalisation et supervision

Analyses cyber du projet

Aucun élément.

Cartographie des risques — Actuel / Résiduel

Espace adhérent 2027

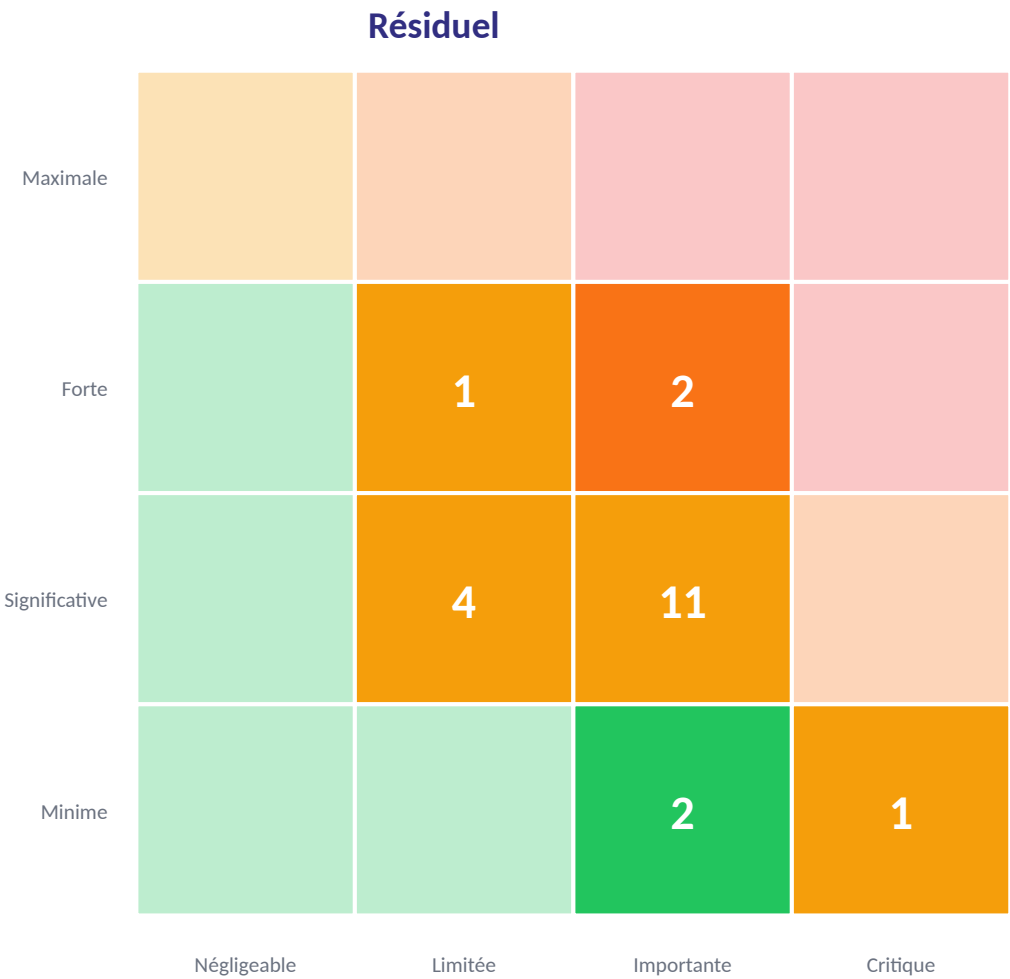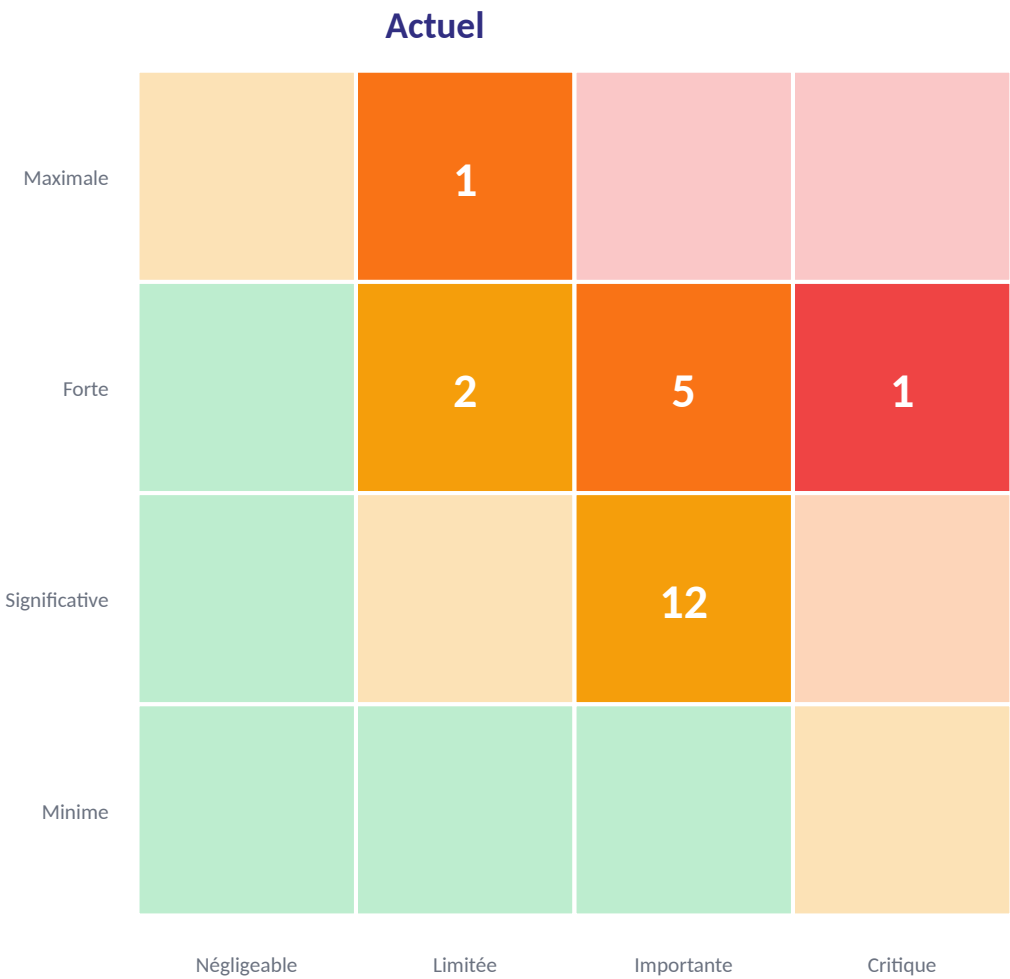

↑ Vraisemblance → Gravité

↑ Vraisemblance → Gravité

Avancement sur les risques

Espace adhérent 2027

Risques

21

Acceptables 20

À traiter

1

Risques à traiter sans plan

0


Réduction brut → résiduel

-22 %


Résiduels au-dessus de l'appétit

0

Répartition des risques par niveau

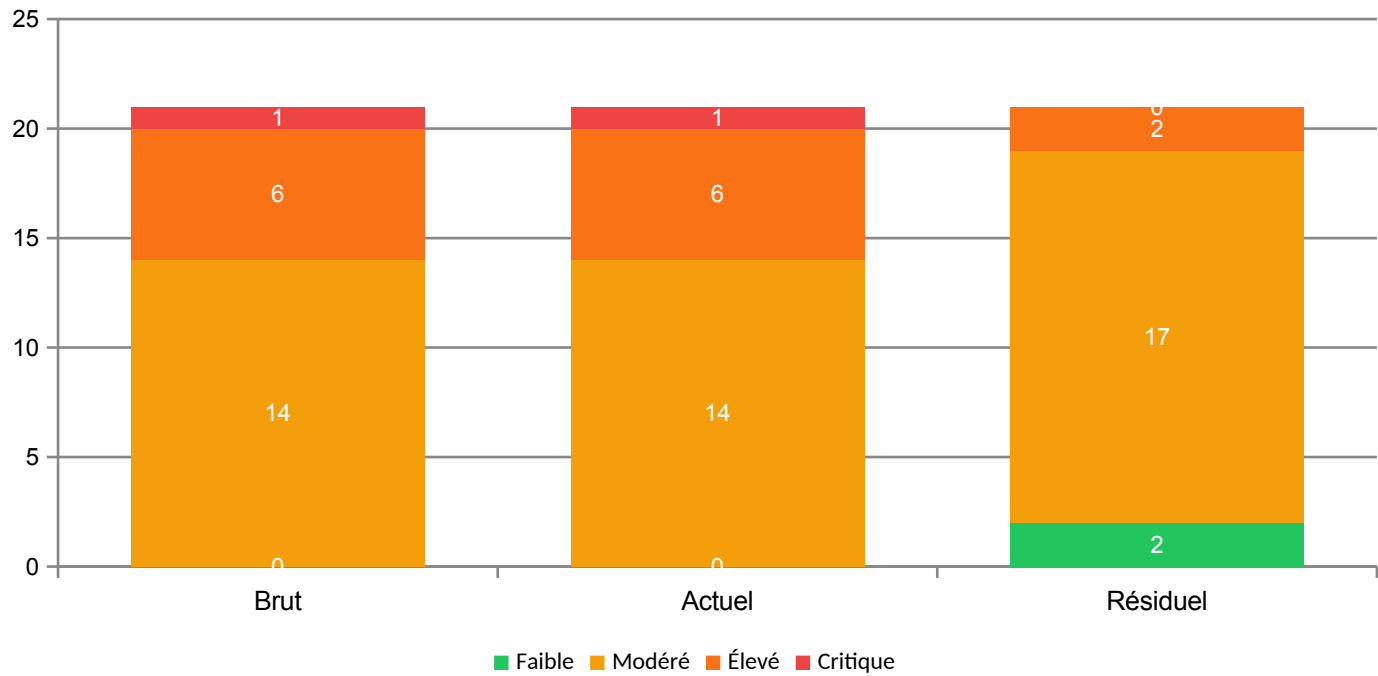

Risques par catégorie

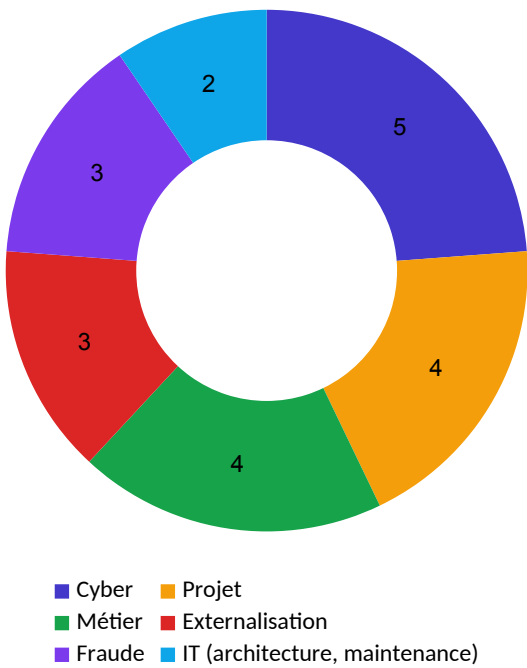

Avancement des plans d'action

Espace adhérent 2027

Avancement des plans

0 %

0 terminé(s) sur 18

Plans en retard

0

Échéance sous 30 jours

0


Plans sans porteur

8

Plans sans échéance


8

Plans par statut

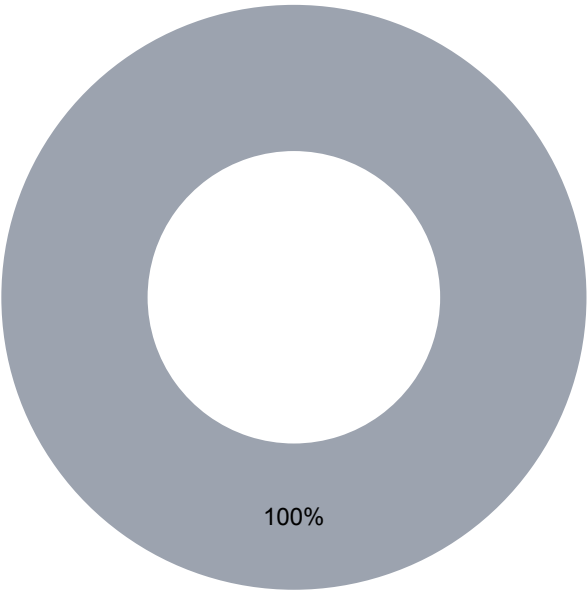

■ À faire ■ En cours ■ Fait

Plans d'action restants

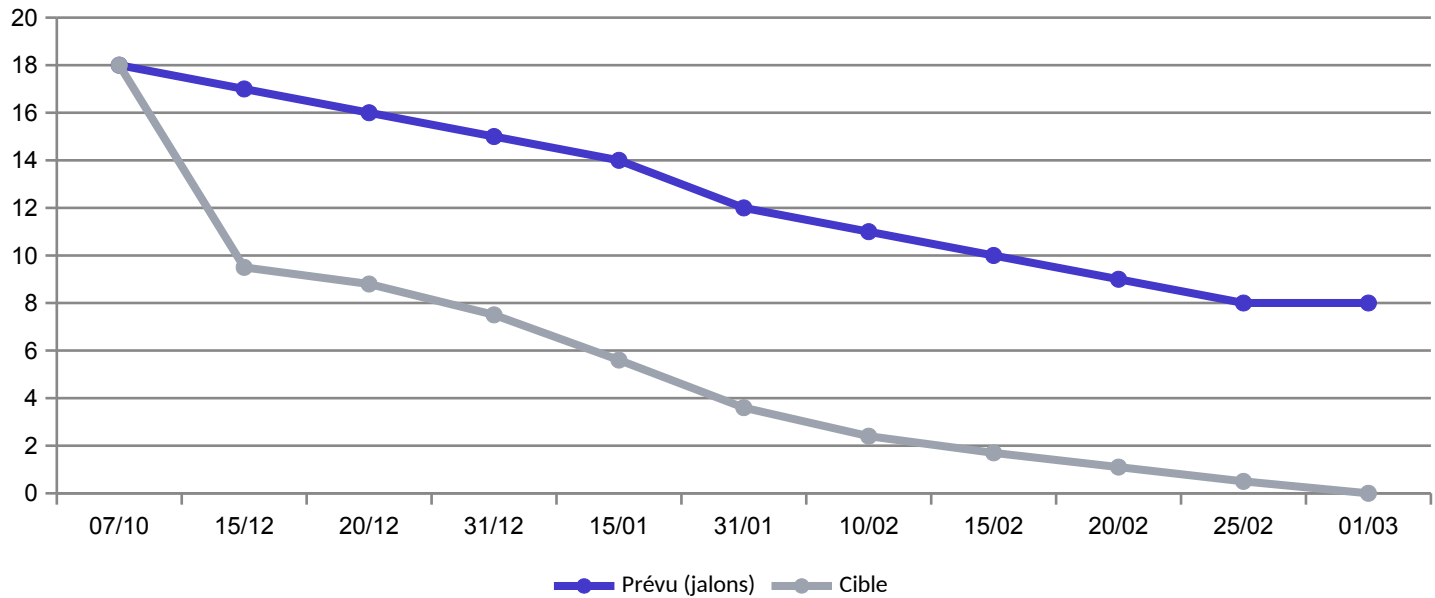

Aujourd'hui : 18 / 18

Plans d'action par priorité

Espace adhérent 2027

Plan d'action	Risque(s) visé(s)	Priorité	Échéance	Statut	Porteur
Choisir un hébergeur certifié HDS et contractualiser	R1 · Fuite des données de santé des adhérents (justificatifs, actes remboursés)	Critique	15/12/2026	À faire	DSI
Test d'intrusion du portail et de l'API avant recette	R1 · Fuite des données de santé des adhérents (justificatifs, actes remboursés)	Critique	31/01/2027	À faire	RSSI
Spécifier le parcours de changement d'IBAN sécurisé	R6 · Prise de contrôle d'espaces adhérents et détournement des remboursements (modification d'IBAN)	Critique	20/12/2026	À faire	Direction relation adhérents
Réaliser et valider l'AIPD du portail et de l'assistant	R4 · Analyse d'impact (AIPD) non réalisée avant la mise en service	Critique	31/01/2027	À faire	DPO
Inscrire l'assistant au registre IA et qualifier son classement	R5 · Réponse erronée ou divulgation de données par l'assistant d'IA (y compris par injection d'instructions)	Majeur	31/12/2026	À faire	DPO
Campagne de tests adverses de l'assistant avant ouverture	R5 · Réponse erronée ou divulgation de données par l'assistant d'IA (y compris par injection d'instructions)	Majeur	10/02/2027	À faire	RSSI
Valider le planning et le chemin critique avec le PMO ou le sponsor	R2 · Dérive du planning : le projet ne tient pas ses jalons	Majeur	—	À faire	—
Intégrer la lecture automatique au dispositif de lutte contre la fraude	R7 · Fraude aux remboursements par faux justificatifs ou devis falsifiés	Majeur	15/02/2027	À faire	Responsable lutte contre la fraude
Inscrire les quatre prestataires au registre d'informations TIC	R20 · Défaillance d'un prestataire TIC critique (signature électronique, IA, paiement) sans réversibilité	Majeur	15/01/2027	À faire	Achats
Exercice de reprise d'activité sur l'environnement de production	R21 · Indisponibilité du portail ou de l'hébergeur au-delà de 4 heures	Majeur	20/02/2027	À faire	Exploitation
Construire le plan de conduite du changement avec les représentants des métiers	R10 · Adhésion insuffisante des utilisateurs, conduite du changement mal préparée	Majeur	—	À faire	—
Faire qualifier le traitement de données personnelles par le DPO	R11 · Traitement de données personnelles non conforme au RGPD (registre, information des personnes, analyse d'impact)	Majeur	—	À faire	—

Plans d'action par priorité (suite 2/2)

Espace adhérent 2027

Plan d'action	Risque(s) visé(s)	Priorité	Échéance	Statut	Porteur
Faire valider le budget et ses provisions par le contrôle de gestion	R8 · Dépassement du budget du projet	Majeur	—	À faire	—
Faire valider les clauses du contrat par les achats et le juridique	R12 · Défaillance d'un prestataire ou d'un fournisseur clé du projet	Majeur	—	À faire	—
Faire valider les exigences de sécurité et le besoin d'homologation par le RSSI	R13 · Exigences de sécurité non prises en compte dans le projet (conception, tests, homologation)	Majeur	—	À faire	—
Identifier les compétences clés et leurs suppléants avec les managers concernés	R9 · Indisponibilité ou départ de compétences clés du projet	Majeur	—	À faire	—
Valider le plan de bascule et de retour arrière avec l'exploitation	R14 · Mise en service perturbée : reprise de données incomplète ou retour arrière impossible	Majeur	—	À faire	—
Former les conseillers et préparer le passage de relais depuis l'assistant	R19 · Conseillers non préparés aux nouveaux parcours et à l'assistant	Modéré	25/02/2027	À faire	Direction relation adhérents
